

# 和東町 総合保健福祉施設 建設NEWS

にゅーす

VOL.

1

和東町総合保健福祉施設の建設工事が令和5年9月から始まりました。  
そこで、新しい施設の建設工事に関する情報を「総合保健福祉施設建設NEWS」として皆様にお知らせしていきます。

## 和東町総合保健福祉施設建設工事に着工しました

このたび、建設工事に着工しました。工事期間は、令和6年12月までの予定です。  
工事中は、騒音、工事車両の通行など十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。

工事概要 | 建築面積：1,631.1m<sup>2</sup> 延床面積：2,445.17m<sup>2</sup>  
構造種別：(本棟)地上2階鉄筋コンクリート+鉄骨造 (渡り廊下)地上2階鉄骨造

完成イメージ 南東外観



完成イメージ 北東鳥瞰



## 工事進捗 | 進捗率 | 10月末 1.07%

場内整地、遣り方等を経て10月24日から基礎工事（地盤改良杭・土工事）が進捗中です。

地盤改良杭 施工状況



土工事掘削 施工状況



## 工事予定

11月は基礎工事、土工事掘削、基礎配筋などを行い、12月からは基礎コンクリート打設、埋戻しなどを行う予定です。

和束町  
総合保健福祉施設にゅーす  
建設NEWSVOL.  
2

和束町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

## 工事の進捗 | 進捗率 | 11月末 2.30%

令和5年10月中旬から基礎杭工事、11月初旬から基礎掘削工事を行ない、現在は基礎工事（鉄骨柱脚工事・鉄筋工事・型枠工事・コンクリート工事）を行っております。  
基礎は、建物を支えるうえで非常に重要な構造部であり、施工品質の管理に努めています。



西工区 施工状況(型枠)



コンクリートを流し込むために必要な型枠を木で組み立てています。

東工区 施工状況(鉄筋)



設計図をもとに鉄筋を組んでいます。

## 工事の予定

年内は12月28日まで、年始は1月9日より現場稼働いたします。

1月は基礎工事、基礎コンクリート打設、埋戻しなどを行う予定です。

引き続き、騒音、工事車両の通行などに十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。

和東町  
総合保健福祉施設にゅーす  
建設NEWSVOL.  
3

和東町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

## 工事の進捗 | 進捗率 | 1月末 9.24%

年始は1月9日から現場稼働し、引き続き基礎工事を行ない、現在は1階床スラブ工事（土・地業工事、鉄筋工事、型枠工事、コンクリート工事）を行っております。

2月末からの鉄骨建て方及びコンクリート躯体工事に向け、施工品質の管理に努めています。




西工区 施工状況(1階床スラブ)



1階床スラブコンクリート打設が完了しました。

東工区 施工状況(土・地業工事)

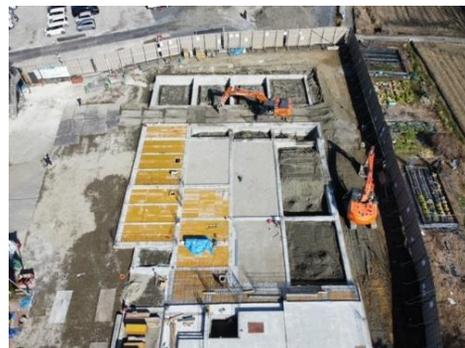

基礎を埋戻し1階床スラブ工事の準備をしています。

## 工事の予定

2月は東工区スラブコンクリート打設、鉄骨及びコンクリート躯体工事に着手する予定です。

引き続き、騒音、工事車両の通行などに十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。
