

和東町  
総合保健福祉施設にゅーす  
建設NEWSVOL.  
3

和東町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

## 工事の進捗 | 進捗率 | 1月末 9.24%

年始は1月9日から現場稼働し、引き続き基礎工事を行ない、現在は1階床スラブ工事（土・地業工事、鉄筋工事、型枠工事、コンクリート工事）を行っております。

2月末からの鉄骨建て方及びコンクリート躯体工事に向け、施工品質の管理に努めています。




西工区 施工状況(1階床スラブ)



1階床スラブコンクリート打設が完了しました。

東工区 施工状況(土・地業工事)

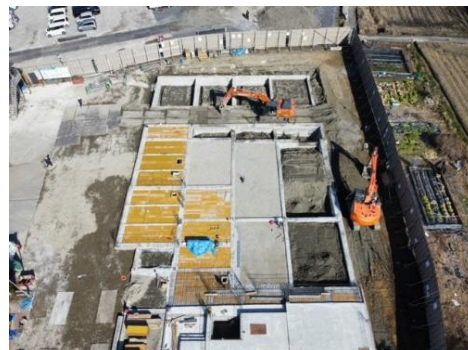

基礎を埋戻し1階床スラブ工事の準備をしています。

## 工事の予定

2月は東工区スラブコンクリート打設、鉄骨及びコンクリート躯体工事に着手する予定です。

引き続き、騒音、工事車両の通行などに十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。
