

和束町
総合保健福祉施設にゅーす
建設NEWSVOL.
5

和束町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

工事の進捗 | 進捗率 | 3月末 20.72%

現在、地上躯体工事及び進捗に合わせて作業用の外部足場組立を行っております。

西工区では鉄骨建て方後の1階コンクリート打設に向け鉄筋・型枠工事、東工区は1階コンクリート打設が完了し2階の躯体工事を進めています。躯体精度確保の為、施工品質の管理に努めています。



西工区 施工状況(躯体工事)



鉄骨建て方後に1階壁の型枠工事をしています。

東工区 施工状況(RC躯体工事)



コンクリート造2階の型枠工事をしています。


鉄骨建て方検査を行いました

現場にて鉄骨の建て方検査を行いました。各工区ごとに鉄骨建て方を行い、柱の鉛直度を測定確認し、精度が設計図通りに施工されているかを検査しました。

検査に合格した後に、本ボルトで締め付けて組立されます。



鉄骨建て方検査



鉛直精度検査

工事の予定

4月も鉄骨建て方及びコンクリート躯体工事を進めていく予定です。建物の骨組が出来ていくと同時に外部に作業用足場の組立を行い、資材等の飛散防止のメッシュシート等で覆っていきます。


引き続き、騒音、工事車両の通行など十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。

和束町
総合保健福祉施設にゅーす
建設NEWSVOL.
6

和束町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

工事の進捗 | 進捗率 | 4月末 29.15%

先月と同様に地上躯体工事及び進捗に合わせて作業用の外部足場組立を行っております。
西工区では2階コンクリート打設に向け鉄筋・型枠工事、東工区は2階躯体コンクリート打設が完了し鉄骨工事を進めています。躯体精度確保の為、施工品質の管理に努めています。

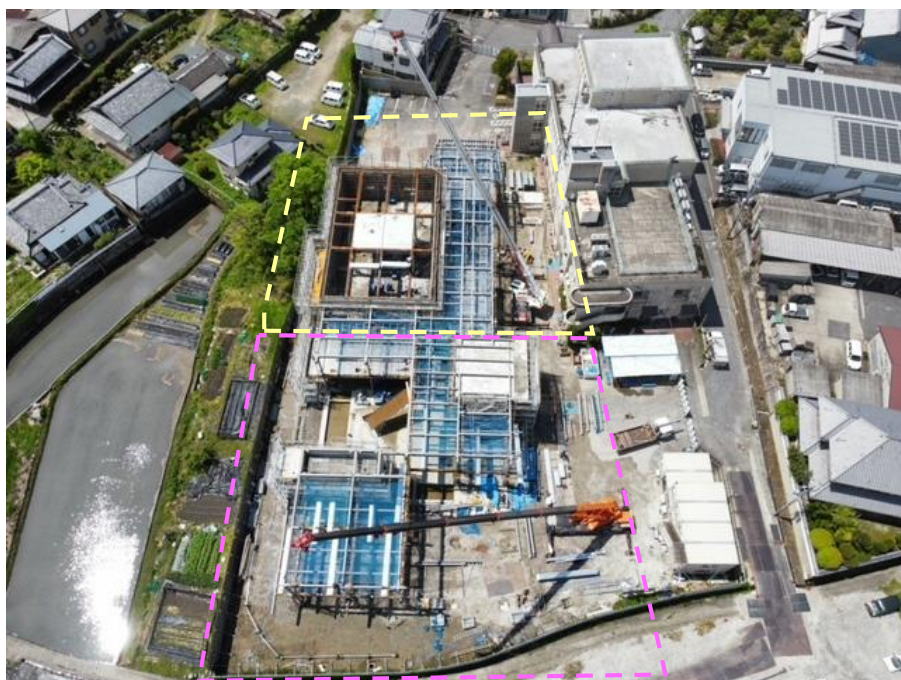

西工区 施工状況(躯体工事)



1階壁のコンクリート打設が完了しました。

東工区 施工状況(鉄骨工事)



最終工区の本体鉄骨建て方を行っています。

各種品質検査を行っています

現場に到着した生コンクリートが設計図の品質規格内になっているか検査します。鉄骨の建て方検査は柱の鉛直度を測定確認し、精度が設計図通りに施工されているかを検査して合格した後に、本ボルトで締め付けて組立します。



コンクリート受入検査



鉄骨鉛直精度検査

工事の予定

5月も鉄骨建て方及びコンクリート躯体工事を進めていく予定です。外部作業用足場の組立を行い、屋根工事、外壁工事の為の下地材を取付ける工事を行っていきます。

引き続き、騒音、工事車両の通行など十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。

和束町
総合保健福祉施設 建設NEWS

にゅーす

VOL.


7

和束町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

工事の進捗 | 進捗率 | 5月末 30.56%

地上躯体工事の鉄骨本体建て方が完了しました。
西工区ではR階コンクリート打設が完了し、地下ピットより設備配管工事を行っています。
東工区は2階床コンクリート打設が完了し屋根・壁の鉄骨下地工事を進めています。躯体精度確保の為、施工品質の管理に努めています。

西工区 施工状況(R階躯体)

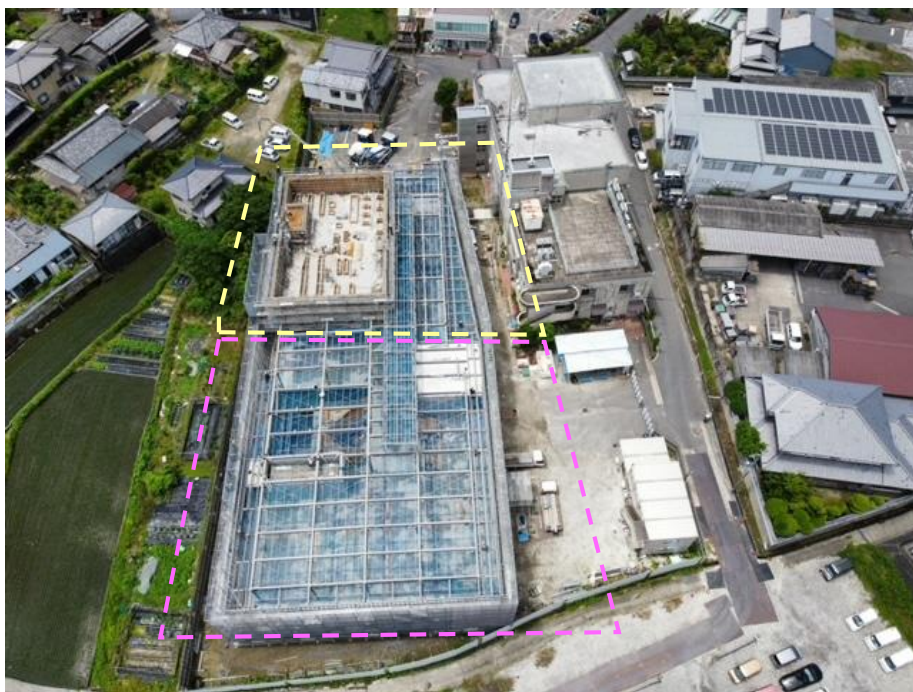

東工区 施工状況(2階床)



外部足場の組立が完了しました。

北面

外部作業用足場で、屋根工事、外壁工事等の下地材、仕上げ材を取付ける工事を行います。



南面



工事の予定

6月は外装（屋根・金属壁）の下地取付工事及び屋根デッキ張り、内部設備配管工事を行います。
引き続き、騒音、工事車両の通行など十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。
