

和東町
総合保健福祉施設 建設NEWS

にゅーす


VOL.
8

和東町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

工事の進捗 | 進捗率 | 6月末 33.12%

現在は鉄骨部分の屋根デッキ伏せ及び屋根防水工事の施工を行っています。
西工区では外壁断熱工、R階の防水工事と内部1階、2階の設備配管配線工事を行っています。
東工区は壁下地貼り工事を進めています。躯体精度確保の為、施工品質の管理に努めています。

西工区 施工状況(内部施工)

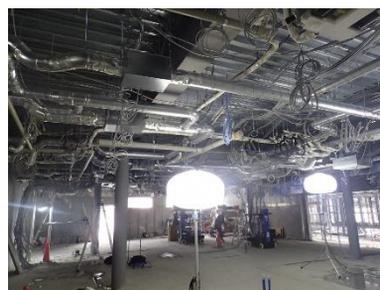

東工区 施工状況(壁下地)



各種受入検査を行っています。

現場に搬入した建具、材料が設計図に準じた材料で規格を満たしているか検査し確認したものを現場にて取り付けます。



建具錆止め塗装膜厚測定検査



使用材料受入検査

工事の予定

7月は外装（屋根・壁）の仕上げ工事と建具の取付、内装工事、設備配管配線工事を行います。引き続き、騒音、工事車両の通行など十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。

和東町
総合保健福祉施設にゅーす
建設NEWSVOL.
9

和東町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

工事の進捗 | 進捗率 | 7月末 39.78%

現在は鉄骨部分の屋根防水工事、外装工事の施工を行っています。
西工区では屋上の防水工事が完了し外装建具取付、1階、2階の内装工事を行っています。
東工区は外装工事、断熱工事を進めています。引き続き、施工品質の管理に努めています。

西工区 施工状況(外装施工)



東工区 施工状況(外装施工)



ガラス工場（富山県高岡市）製品検査を行いました。

現場に搬入取付する製品が設計図に準じた材料で施工図の寸法、規格を満たしているか検査し確認したものを現場に搬入し取付ます。



カーテンウォール硝子製品検査



ガラス寸法検査

工事の予定

8月も外装（壁・建具ガラス）の仕上げ工事と内装仕上げ工事、設備配管配線工事を行います。引き続き、騒音、工事車両の通行など十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。


和東町
総合保健福祉施設にゅーす
建設NEWSVOL.
10

和東町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

工事の進捗 | 進捗率 | 8月末 46.63%

現在は外装工事及び内装工事・設備工事の施工を行っています。
西工区では屋上機械設備の据付、1階、2階の内装工事を行っています。
東工区は外装工事、内部設備工事を進めています。引き続き、施工品質の管理に努めています。

西工区 施工状況(外装施工)

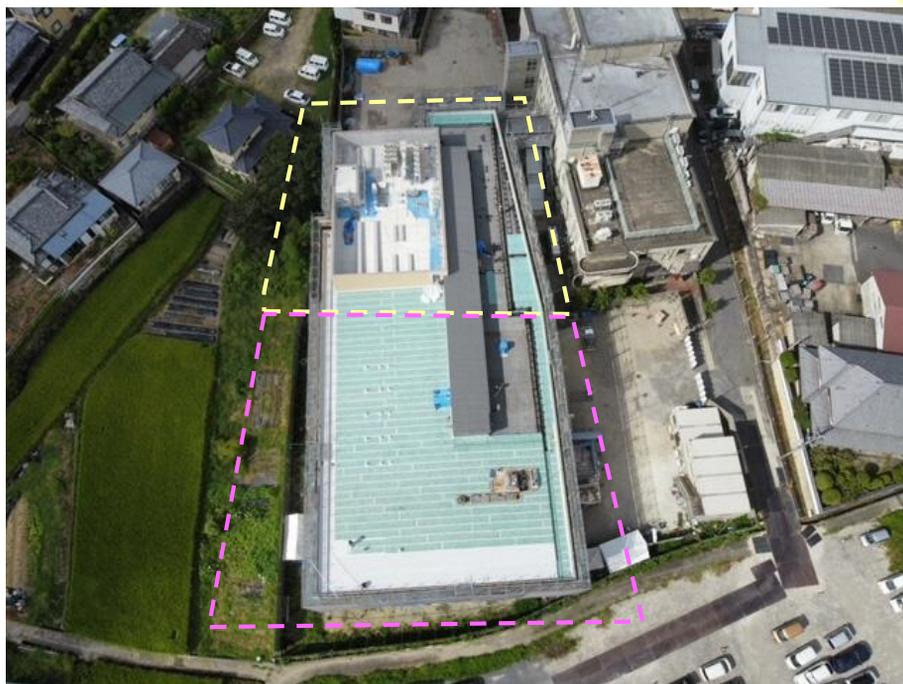

東工区 施工状況(外装施工)



足場解体前には外観検査を行っています。

各種外壁仕上げ工事が完了し外部足場を解体する前には外観検査を行い、キズ汚れなど問題がないか確認し完了後に解体します。



外観検査



外観検査状況

工事の予定

9月は引き続き外装の仕上げ工事と内装仕上げ工事、設備配管配線工事を行い、東工区の一部足場解体を予定しています。
引き続き、騒音、工事車両の通行など十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。

和束町
総合保健福祉施設にゅーす
建設NEWSVOL.
11

和束町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

工事の進捗 | 進捗率 | 9月末 62.65%

現在は屋上の防水工事が完了し、外装の外観検査及び外部足場の解体を順次行っています。内部については引き続き内装工事・設備工事を施工品質の管理に努めながら行っています。



外部足場の解体を順次行っています。

各種外装仕上げ工事が完了し、外観検査にて施工状況、仕上り状況など品質精度に問題がないことを確認した後、外部足場を解体していきます。

外観状況



工事の予定

10月は全ての外部足場の解体を予定しています。また月末からは外構工事に着手していきます。引き続き、騒音、工事車両の通行など十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。

和束町
総合保健福祉施設にゅーす
建設NEWSVOL.
12

和束町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

工事の進捗 | 進捗率 | 10月末 79.90%

現在は外部足場の解体搬出が完了し、順次外構雨水排水工事を行っています。内部については引き続き内装工事・設備工事を施工品質の管理に努めながら行っています。



外部足場の解体が完了しました。



外観南状況



外観西状況



内観吹抜状況

工事の予定

11月は順次、工事区画の仮囲いを撤去し簡易柵に切替えて本格的に外構工事を進めていきます。引き続き、騒音、工事車両の通行など十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。

和束町
総合保健福祉施設にゅーす
建設NEWSVOL.
13

和束町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

工事の進捗 | 進捗率 | 11月末 90.97%

現在は外構（雨水排水、小構造物基礎、埋設配管）工事を行っています。本設受電工事が完了し、内部は各種内装仕上げ・器具付け等を図面を最終確認しながら行っています。



外構工事を進めています。



外観南状況



外観北状況



内部2F吹抜状況

工事の予定

12月は引き続き外構工事・既存庁舎前舗装工事及び内装仕上げ工事を進めていきます。年末に向けて、より一層 騒音、工事車両の通行など十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。
