


和束町
総合保健福祉施設にゅーす
建設NEWSVOL.
6

和束町総合保健福祉施設建設工事の進捗状況や工事予定等について、皆様にお知らせします。

工事の進捗 | 進捗率 | 4月末 29.15%

先月と同様に地上躯体工事及び進捗に合わせて作業用の外部足場組立を行っております。
西工区では2階コンクリート打設に向け鉄筋・型枠工事、東工区は2階躯体コンクリート打設が完了し鉄骨工事を進めています。躯体精度確保の為、施工品質の管理に努めています。

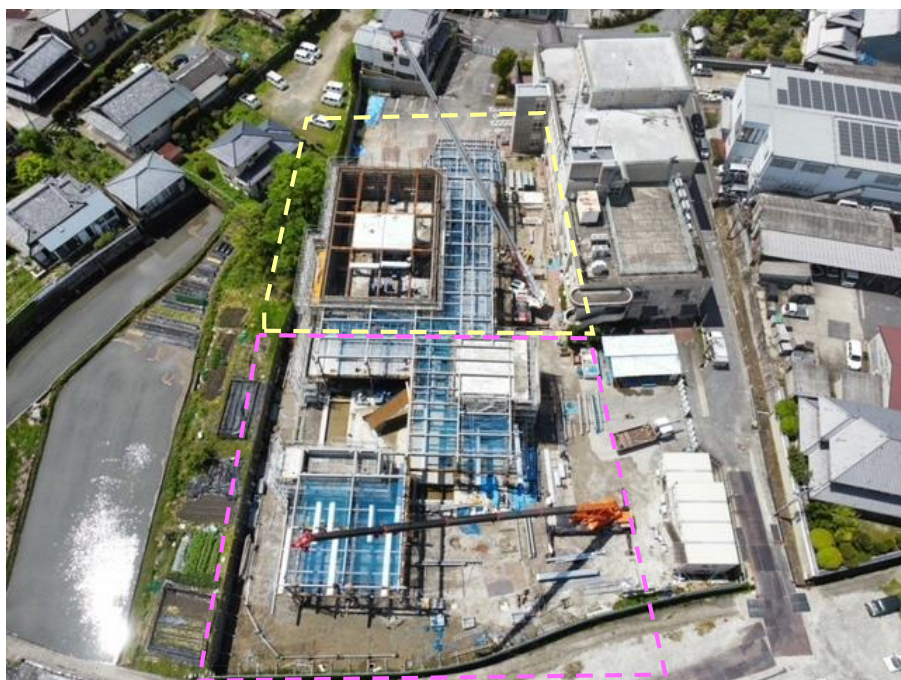

西工区 施工状況(躯体工事)



1階壁のコンクリート打設が完了しました。

東工区 施工状況(鉄骨工事)



最終工区の本体鉄骨建て方を行っています。

各種品質検査を行っています

現場に到着した生コンクリートが設計図の品質規格内になっているか検査します。鉄骨の建て方検査は柱の鉛直度を測定確認し、精度が設計図通りに施工されているかを検査して合格した後に、本ボルトで締め付けて組立します。



コンクリート受入検査



鉄骨鉛直精度検査

工事の予定

5月も鉄骨建て方及びコンクリート躯体工事を進めていく予定です。外部作業用足場の組立を行い、屋根工事、外壁工事の為の下地材を取付ける工事を行っていきます。

引き続き、騒音、工事車両の通行などに十分に配慮し、安全第一を最優先に進めますので、御理解と御協力をお願いします。
